


Valor Ganado

Denominacion	Tareas	HORAS REALES	ACUMULADO REAL	HORAS PREVISTAS	ACUMULADO PREVISTO	SEMANA REAL	SEMANA PREVISTA	Ricardo	Victor	Pablo	Sergi
Inicio	Diseñar página web	12	12	15	15	15	15			02/04/2018	
	Organización del Proyecto	14	26	14	29	15	15	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018
Project Charter	Crear Acta de Constitución del Proyecto	10	36	12	41	16	17	17/04/2018			
Gestión Interesados	Identificar los interesados del Proyecto	12	48	10	51	17	18	26/04/2018			26/04/2018
Alcance	Plan de gestión del Alcance	2	50	3	54	19	20	07/05/2018	07/05/2018		
	Plan de gestión de los Interesados	3	53	4	58	19	20	07/05/2018			07/05/2018
	Recopilar Requisitos	8	61	8	66	19	20	07/05/2018			
	Definir el Alcance	5	66	3	69	19	20	08/05/2018	08/05/2018		
	Crear la EDT/WBS	10	76	10	79	19	20	08/05/2018			
	Diccionario EDT	24	100	10	89	20	20	11/05/2018			
	Validar el Alcance	2	102	2	91	20	20	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	
	Controlar el Alcance	1	103	1	92	20	20	14/05/2018			
	Plan de gestión del tiempo	3	106	3	95	19	21		08/05/2018		
Tiempo	Definir las actividades	8	114	10	105	19	21		08/05/2018		
	Secuenciar actividades	6	120	10	115	19	21		09/05/2018		
	Estimar los recursos de las actividades	4	124	5	120	19	21		09/05/2018		
	Estimar la duración de las actividades	2	126	5	125	20	21	12/05/2018	12/05/2018	12/05/2018	
	Desarrollar el Cronograma	3	129	4	129	20	21		13/05/2018		
	Controlar el cronograma	2	131	2	131	20	21	13/05/2018			
Costes	Plan de gestión de los Costes	2	133	2	133	22	21			02/06/2018	
	Estimar los Costes	7	140	8	141	22	21			03/06/2018	03/06/2018
	Establecer el Presupuesto	4	144	4	145	23	21	03/06/2018	03/06/2018	03/06/2018	
	Controlar los Costes	3	147	2	147	23	21			06/06/2018	
Calidad	Plan de gestión de la Calidad	2	149	1	148	22	22			12/06/2018	
	Gestión de la calidad	12	161	8	156	22	22	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	
	Controlar la Calidad	2	163	1	157	22	22			15/06/2018	
Recursos Humanos	Plan de Gestión de los Recursos Humanos	8	171	6	163	21	22		25/05/2018		
Comunicación	Plan de gestión de las comunicaciones	8	179	6	169	24	23				14/06/2018
	Controlar las comunicaciones	4	183	2	171	24	23				14/06/2018
Riesgos	Plan de Gestión de los Riesgos	2	185	1	172	24	24			12/06/2018	
	Identificación de los Riesgos	10	195	12	184	24	24			12/06/2018	
	Realizar el análisis cualitativo	18	213	15	199	24	24			12/06/2018	
	Realizar el análisis cuantitativo	12	225	12	211	25	24	23/06/2018	23/06/2018	18/08/2018	
	Planificar las respuestas	8	233	10	221	26	24		24/06/2018	25/06/2018	
	Controlar los riesgos	2	235	2	223	26	24			25/06/2018	
Lecciones aprendidas	Lecciones aprendidas	5	240	5	228	27	26	30/06/2018	30/06/2018	30/06/2018	30/06/2018
Actas	Acta 1	0,8	241	1	229				24/03/2018		24/03/2018
	Acta 2	0,5	241	0,8	230				03/04/2018		03/04/2018
	Acta 3	0,5	242	0,8	231				15/04/2018		
	Acta 4	0,5	242	0,5	231				21/05/2018		
	Acta 5	0,5	243	0,5	232				13/06/2018		
	Acta 6	0,5	243	0,5	232				02/07/2018		

Valor Ganado - Horas Previstas/Reales



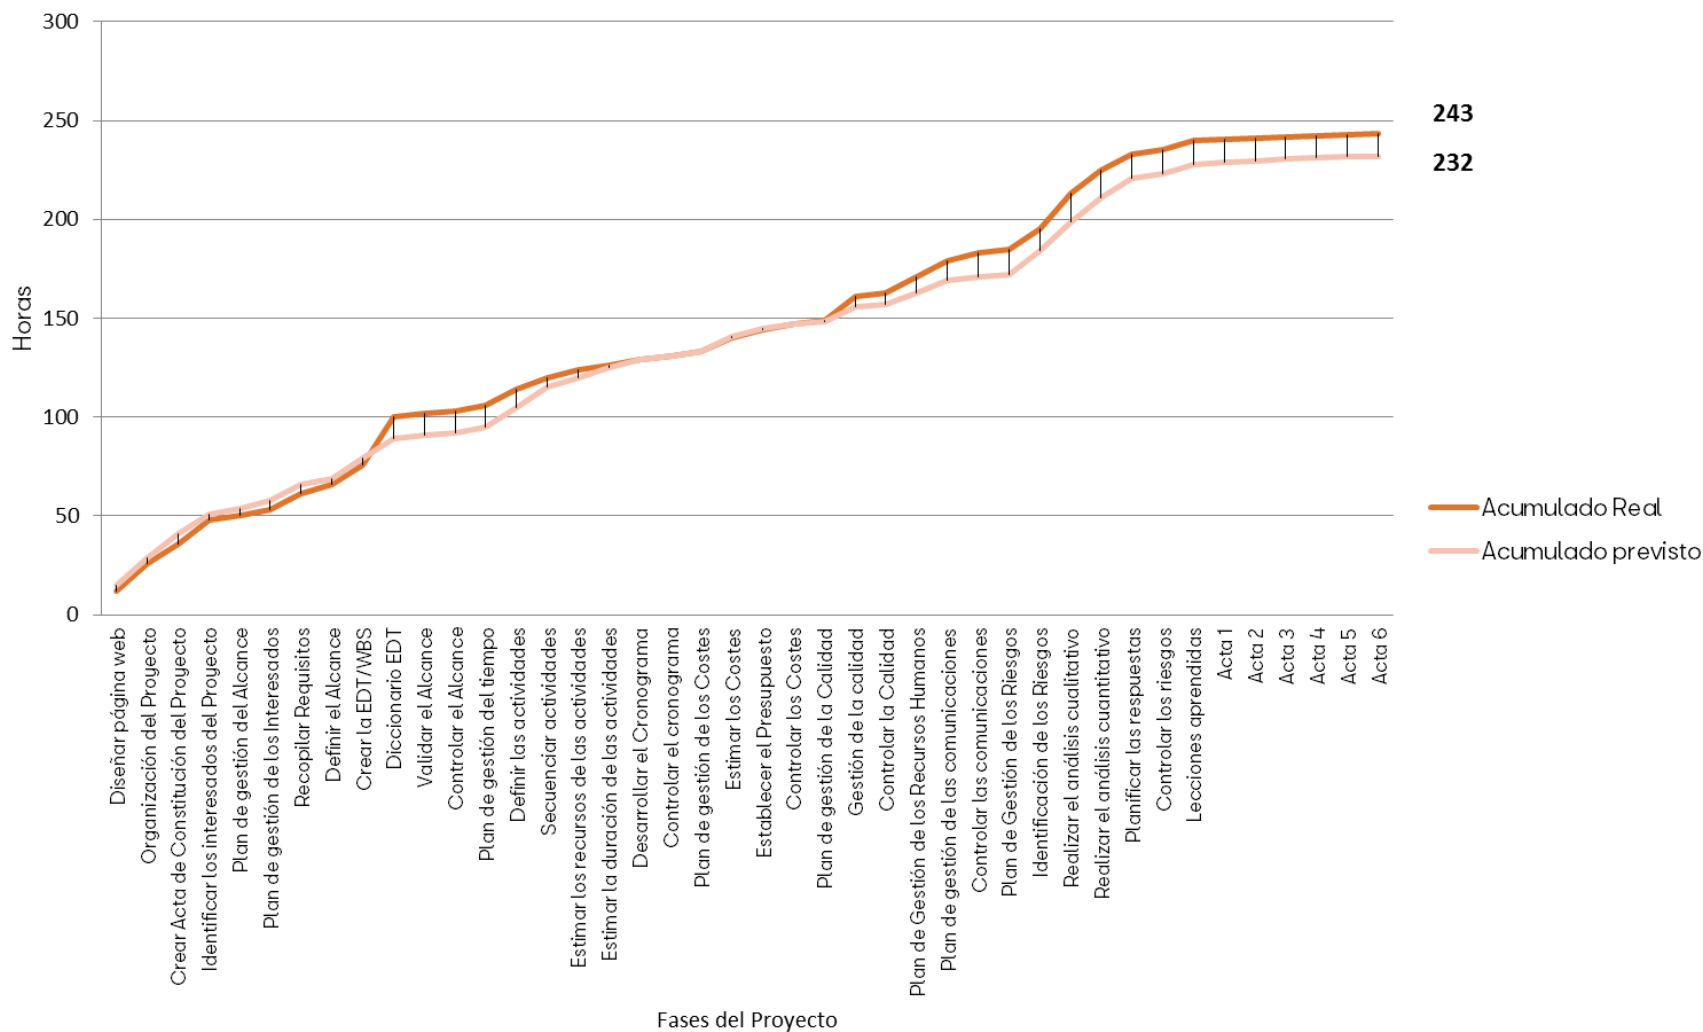

Valor Ganado

