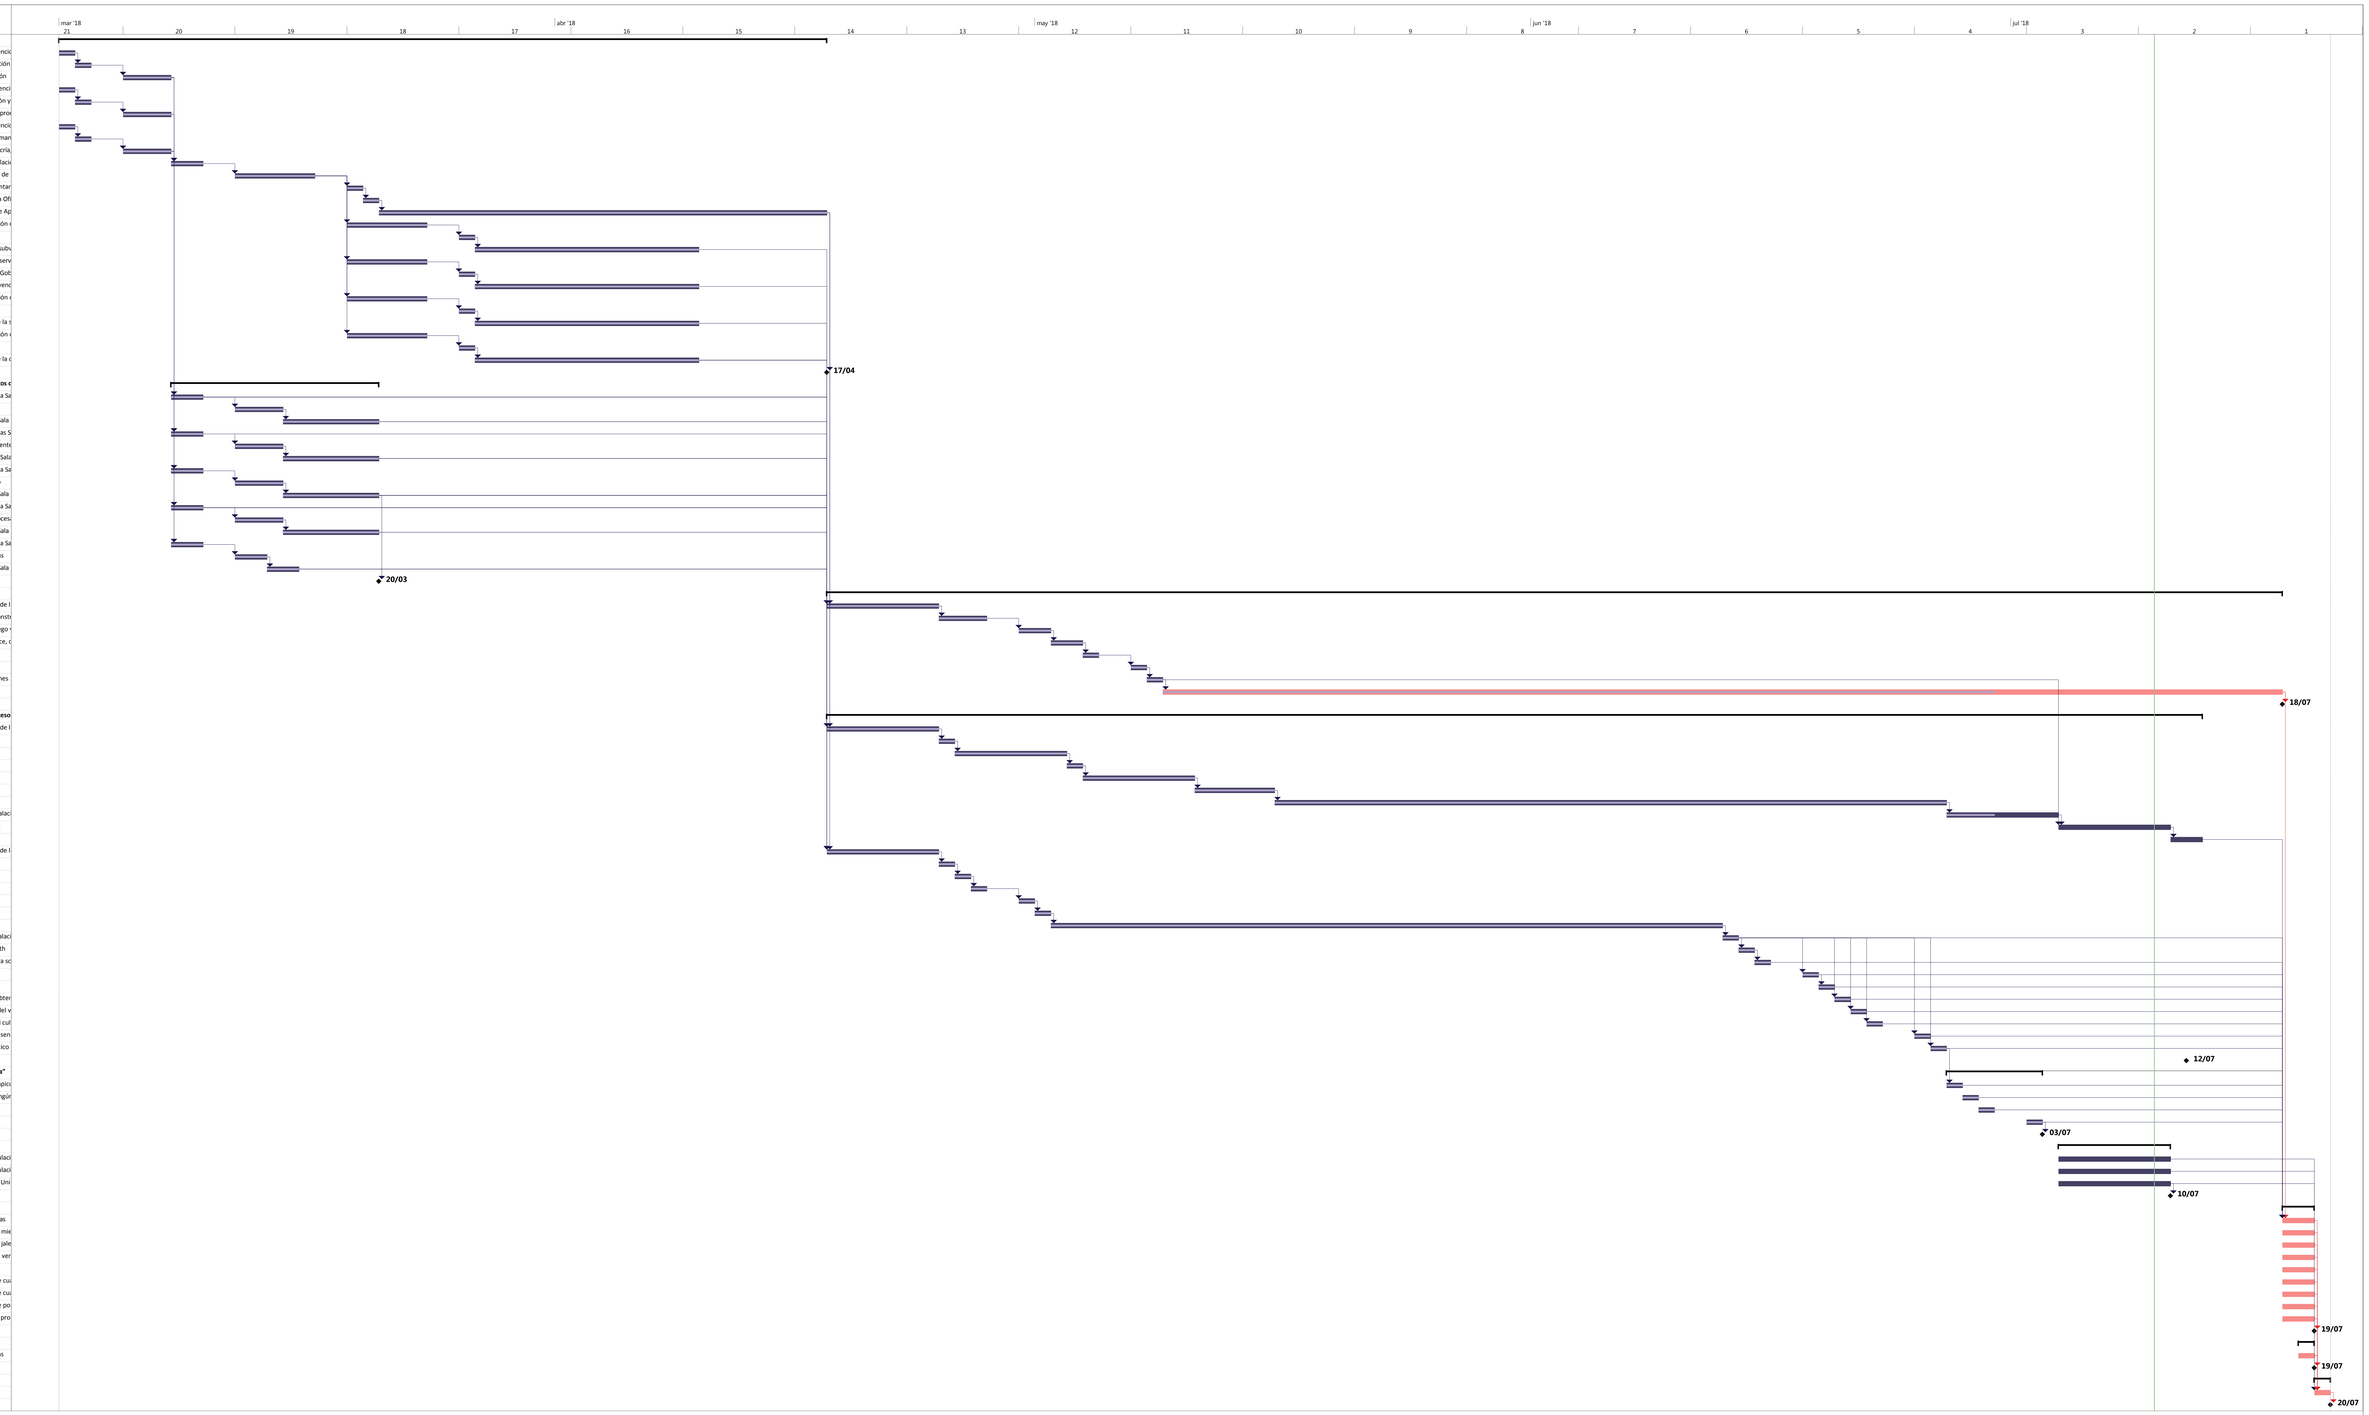Id	Nombre de tarea
1	**1. Planificación análisis del entorno**
2	1.1.1 Contactar con organización para obtencio
3	1.1.2 Obtención de normativa de construcción
4	1.1.3 Definición requerimientos construcción
5	1.2.1 Contactar con organización para obtenci
6	1.2.2 Obtención de normativa de producción y
7	1.2.3 Definición de requerimientos para la pro
8	1.3.1 Contactar con organización para obtencio
9	1.3.2 Obtención de normativa para la cría/man
10	1.3.3 Definición de requerimientos para la cría
11	1.4.1 Entrega de croquis de layout de instalaci
12	1.4.2 Preparación (junto con la Asociación) de
13	1.4.3 Entrega de documentación en el Ayuntar
14	1.4.4 Presentación de documentación en la OfI
15	1.4.5 Obtención del Número de Registro de Ap
16	1.5.1 Preparación de dosier para la obtención
17	1.5.2 Depositar dosier en la Generalitat
18	1.5.3 Respuesta de la Generalitat sobre la subv
19	1.6.1 Preparación de dosier por la cría/conserv
20	1.6.2 Depositar dosier en la Delegación de Gob
21	1.6.3 Respuesta del Gobierno sobre la subvenc
22	1.7.1 Preparación de dosier para la obtención
23	1.7.2 Enviar dosier a la Unión Europea
24	1.7.3 Respuesta de la Unión Europea sobre la s
25	1.8.1 Preparación de dosier para la obtención
26	1.8.2 Enviar dosier a la Unión Europea
27	1.8.3 Respuesta de la Unión Europea sobre la
28	Cierre apdo 1
29	**2. Planificación de definición de requerimientos**
30	2.1.1 Estudio de superficie necesaria para la Sa
31	2.1.2 Diseño de layout de la Sala Blanca
32	2.1.3 Estudio de acondicionamiento de la Sala
33	2.2.1 Estudio de superficie necesaria para las S
34	2.2.2 Diseño de layout de las Salas de Cuarente
35	2.2.3 Estudio de acondicionamiento de las Sala
36	2.3.1 Estudio de superficie necesaria para la Sa
37	2.3.2 Diseño de layout de la Sala de Cultivo
38	2.3.3 Estudio de acondicionamiento de la Sala
39	2.4.1 Estudio de superficie necesaria para la Sa
40	2.4.2 Diseño de layout de la Sala de Posprocesa
41	2.4.3 Estudio de acondicionamiento de la Sala
42	2.5.1 Estudio de superficie necesaria para la Sa
43	2.5.2 Diseño de layout de la Sala de Oficinas
44	2.5.3 Estudio de acondicionamiento de la Sala
45	Cierre apdo 2
46	**3. Planificación construcción instalaciones**
47	3.1.1 Realización de pliego de condiciones de l
48	3.1.2 Recepción del pliego (por parte de const
49	3.1.3 Revisión de feedback, revisión de pliego
50	3.2.1 Recepción y revisión de oferta (alcance,
51	3.2.2 Firma del Contrato de Obra
52	3.3.1 Validación final
53	3.3.2 Firma de aceptación de las instalaciones
54	3.3.3 Construcción
55	Cierre apdo 3
56	**4. Planificación de la implementación de proceso**
57	4.1.1 Realización de pliego de condiciones de l
58	4.1.2 Envío de pliego a proveedores
59	4.1.3 Recepción de ofertas
60	4.1.4 Planificación de Órdenes de Compra
61	4.1.5 Diseño de maquinaria
62	4.1.6 Aceptación del diseño
63	4.1.7 Fabricación de maquinaria
64	4.1.8 Aceptación de maquinaria en las instalac
65	4.1.9 Instalación y puesta a punto en ICAM
66	4.1.10 Validación de maquinaria
67	4.2.1 Realización de pliego de condiciones de l
68	4.2.2 Envío de pliego a proveedores
69	4.2.3 Recepción de ofertas
70	4.2.4 Envío de Órdenes de Compra
71	4.2.5 Diseño de utillajes
72	4.2.6 Aceptación del diseño
73	4.2.7 Fabricación de utillajes
74	4.2.8 Aceptación de los utillajes en las instalaci
75	4.3.1 Adquisición de 10 colmenas Langstroth
76	4.3.2 Adquisición de bases de cemento para sc
77	4.4.1 Compra de vestimenta protectora
78	4.5.1 Compra de 10 fumadores
79	4.6.1 Compra de material necesario para obter
80	4.7.1 Compra de cámaras para extracción del v
81	4.8.1 Compra de material necesario para el cul
82	4.9.1 Compra de todo el HW informático y sen
83	4.9.2 Compra de todo el Software informático
84	Cierre apdo 4
85	**5. Planificación adquisición de "materia prima"**
86	5.1 Adquisición de enjambres de abejas a apic
87	5.2 Luz verde a que la colmena no tiene ningú
88	5.3 Adquisición de abejas reina
89	5.4 Adquisición de plantas
90	Cierre apdo 5
91	**6. Planificación obtención de certificaciones**
92	6.1 Obtención de certificación para manipulaci
93	6.2 Obtención de certificación para manipulaci
94	6.3 Obtención de certificación y sello de la Uni
95	Cierre apdo 6
96	**7. Planificación validación de procesos**
97	7.1 Validación de proceso de cría y colmenas
98	7.2 Validación de proceso de obtención de mie
99	7.3 Validación de proceso de obtención de jale
100	7.4 Validación de proceso de extracción de ver
101	7.5 Validación del huerto ecológico
102	7.6 Validación de procedimiento de Sala de cu
103	7.7 Validación de procedimiento de Sala de cu
104	7.8 Validación de procedimiento de Sala de po
105	7.9 Validación de sensores para control de pro
106	Cierre apdo 7
107	**8. Lessons Learned**
108	8.1 Documentación de lecciones aprendidas
109	Cierre apdo 8
110	**9. Cierre de proyecto**
111	9.1 Aceptación y cierre de proyecto
112	Cierre apdo 9
